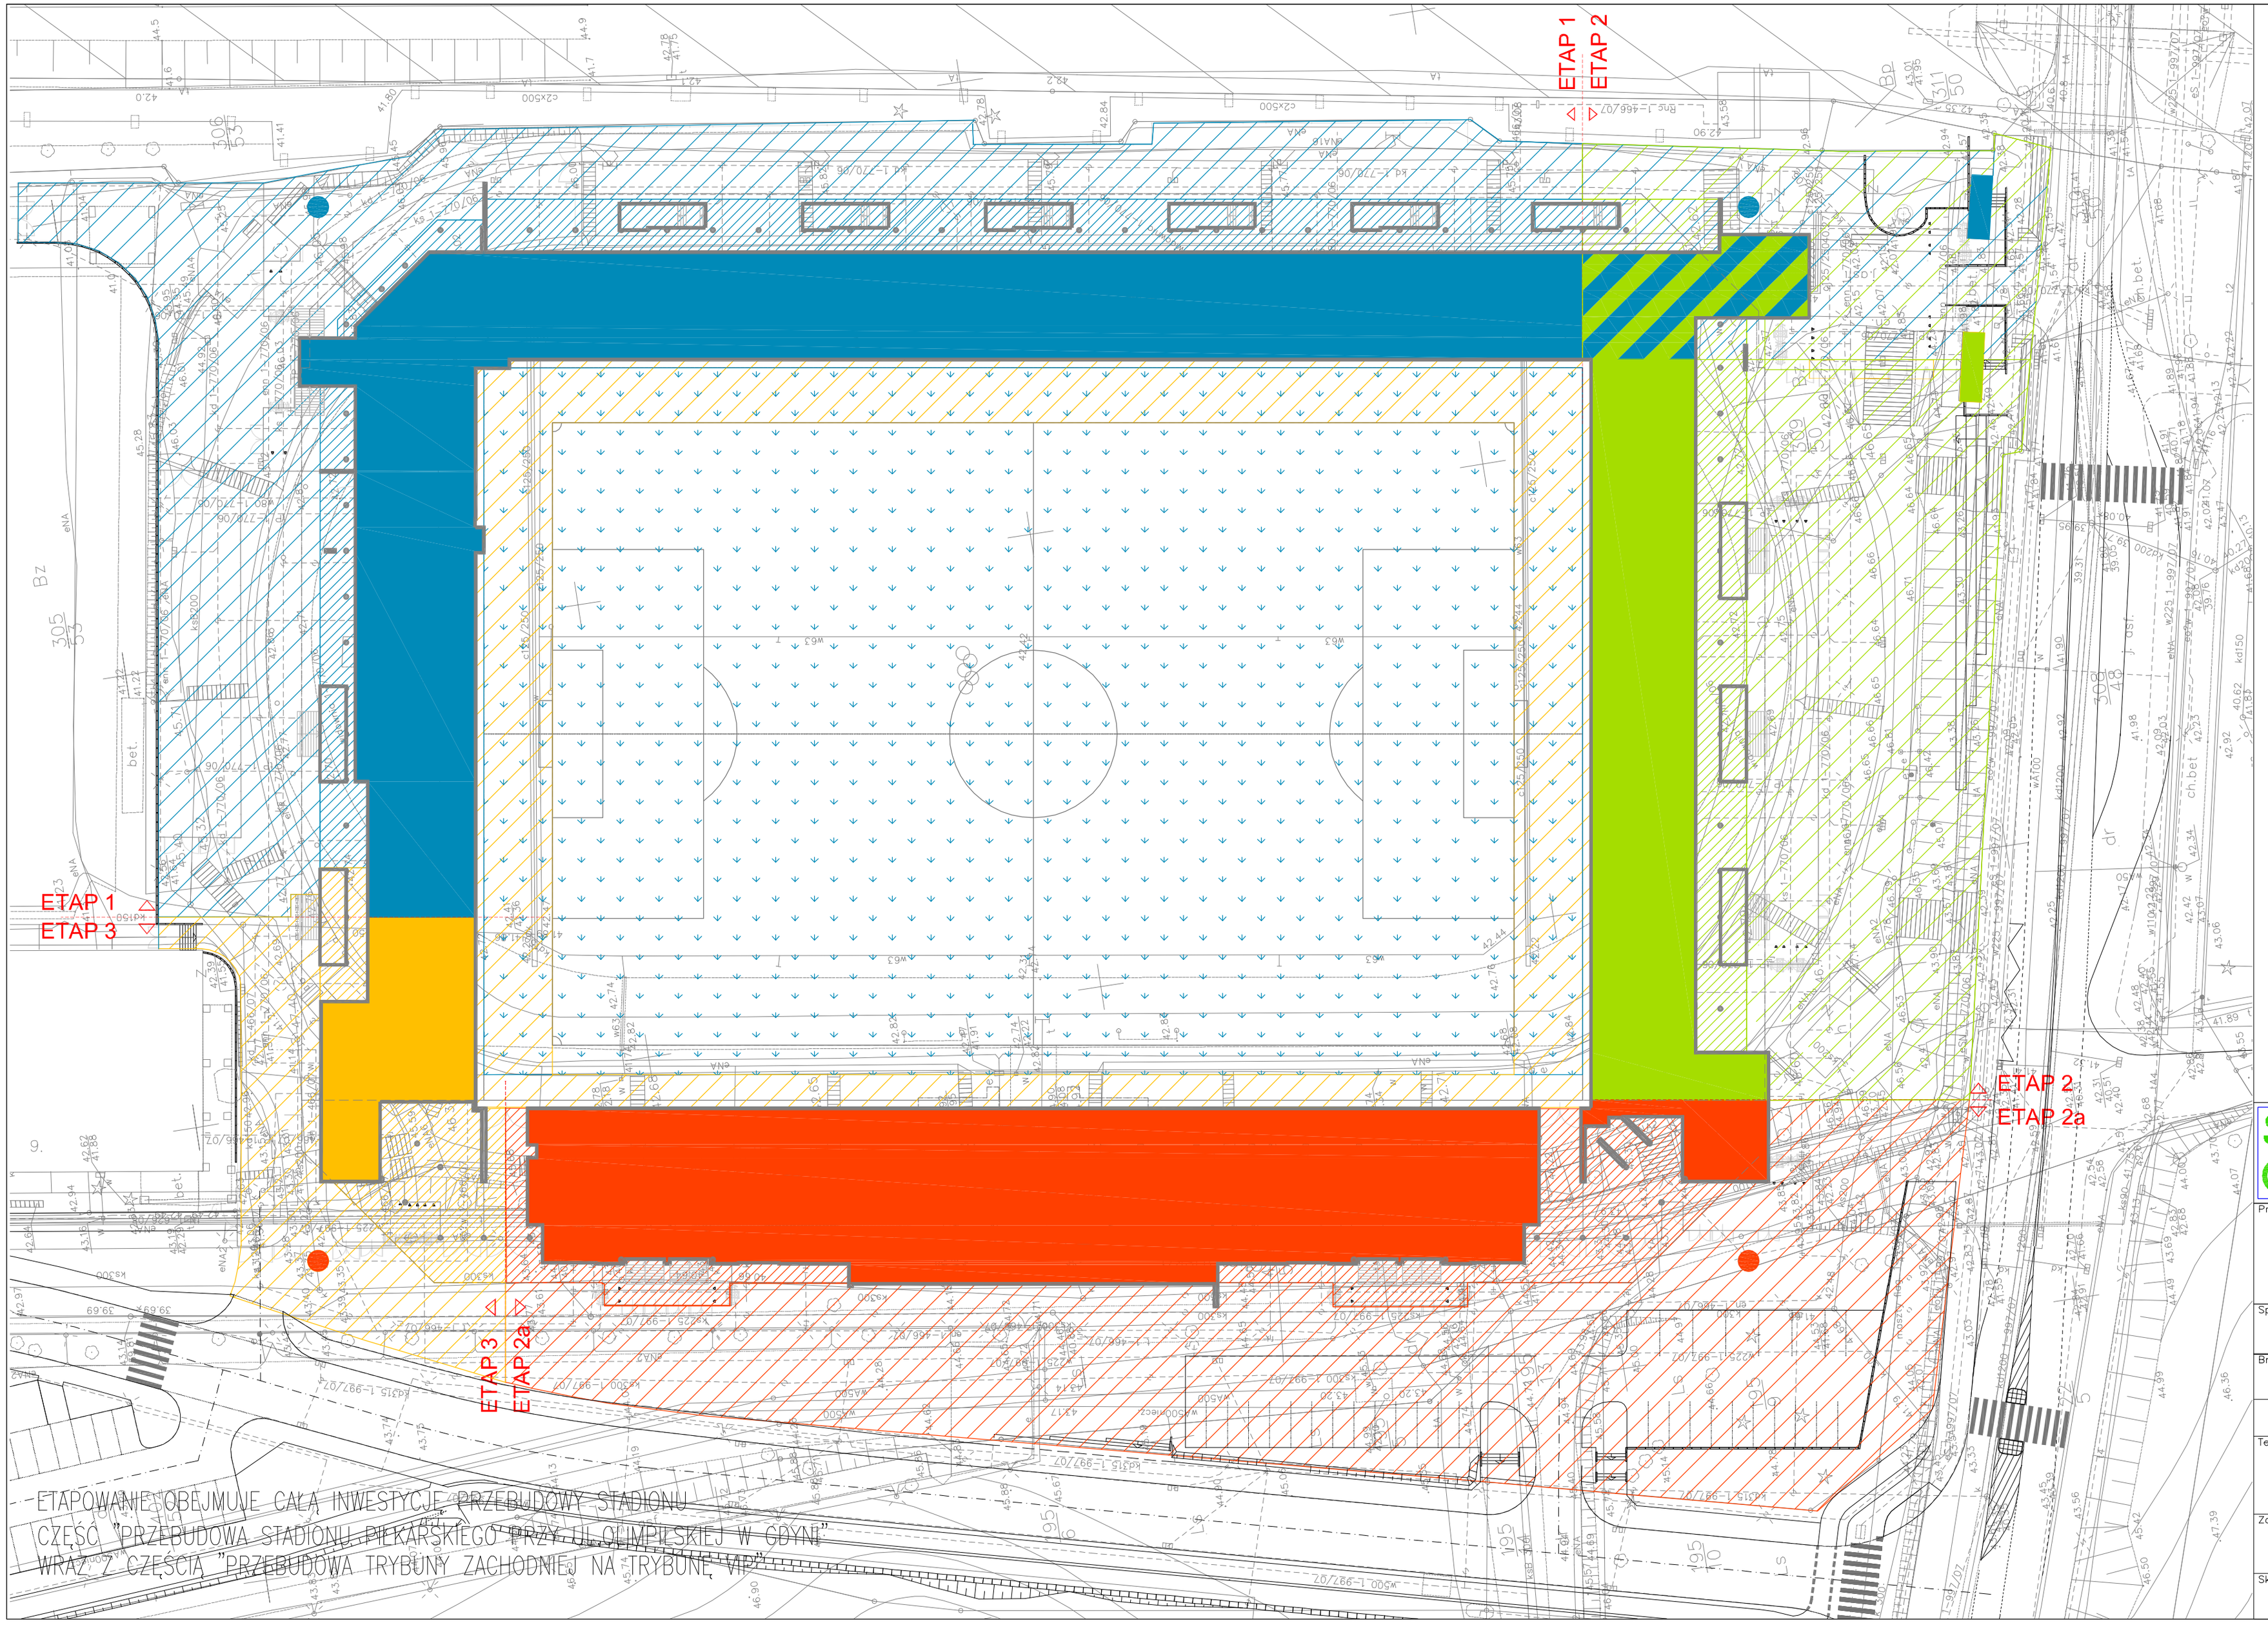



ETAP I

1. rozbiórka części trybuny północnej, wschodniej i pawilonów gastronomiczno - handlowych i kasy
2. likwidacja nasypów, niwelacja terenu
3. przygotowanie i organizacja placu budowy
4. przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu wraz z separatorem, drenażem i ogrzewaniem płyty boiska
5. budowa trybun
6. budowa obiektów pod trybunami - ściany zewnętrzne, wewnętrzne, roboty instalacyjne wewnętrzne, roboty wykończeniowe i wyposażenie
7. rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia od strony wschodniej i północnej
8. budowa dwóch masztów oświetleniowych
9. budowa elementów żelbetowych narożnika

ETAP II

1. przeniesienie i rozbudowa węzła cieplnego
2. rozbiórka trybuny południowej i pawilonu gastronomiczno - handlowego i kasy
3. likwidacja nasypów, niwelacja terenu
4. przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu
5. budowa trybun
6. budowa obiektów pod trybunami - ściany zewnętrzne, wewnętrzne, roboty wykończeniowe i wyposażenie
7. rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia od strony południowej wraz z fundamentem pod bramę pamiątkową

ETAP IIa

1. rozbiórka trybuny zachodniej
2. rozbiórka ogrodzenia od strony zachodniej
3. likwidacja nasypów, niwelacja terenu
4. przebudowa uzbrojenia podziemnego
5. budowa trybun wraz z budynkiem zaplecza (ściany zewnętrzne, wewnętrzne)
6. budowa zadaszenia na trybunę
7. przebudowa istniejącego podgrzewania i drenażu
8. budowa ogrodzenia od ul. Olimpijskiej
9. budowa dwóch masztów oświetleniowych

ETAP III

1. przeniesienie bramy pamiątkowej
2. rozbiórka pozostałej części trybuny północnej
3. likwidacja nasypów, niwelacja terenu
4. przebudowa wejść na adaptowaną trybunę zachodnią
5. przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu wraz z centrum monitoringu i naglośnienia
6. budowa trybuny
7. budowa zadaszenia trybun
8. renowacja murawy trybun
9. wykonanie nawierzchni i elementów małej architektury
10. uporządkowanie placu budowy

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WŁ
arch. Kamila KAMIŃSKA
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zawiera
ETAPOWANIE INWESTYCJI

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:500	03/2009	W-ZT-1004	01
